



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 09/10/2024

Inspecteur: Baptiste Hollemaert

Mentor:

Installateur: Coppelec

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0754 886 266

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19370770

Datum verslag: 11/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Molenstraat
Huisnummer 36
Busnummer
Postcode 9988
Gemeente Watervliet
Land België

Eigenaar

Naam De Decker
Straatnaam Molenstraat
Huisnummer 36
Busnummer
Postcode 9988
Gemeente Watervliet
Land België

Installateur

Naam Coppelec
BTW nr. BE 0754 886 266
Telefoonnummer +32 476 83 74 46
E-mail info@coppelec.be

Type : woning

EAN : 541448820048593487

Teller Nr. : 1SAG3200241078

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor
01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 27

Aardelektrode: Aardingslus

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Ri algemeen: 22.0 MΩ

RE: 8.08 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	27	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema in bijlage					
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 9/10/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:40 tot 15:44

De inspecteur Baptiste Hollemaert

Baptiste Hollemaert



ACEG VZW - #189

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 9/10/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.










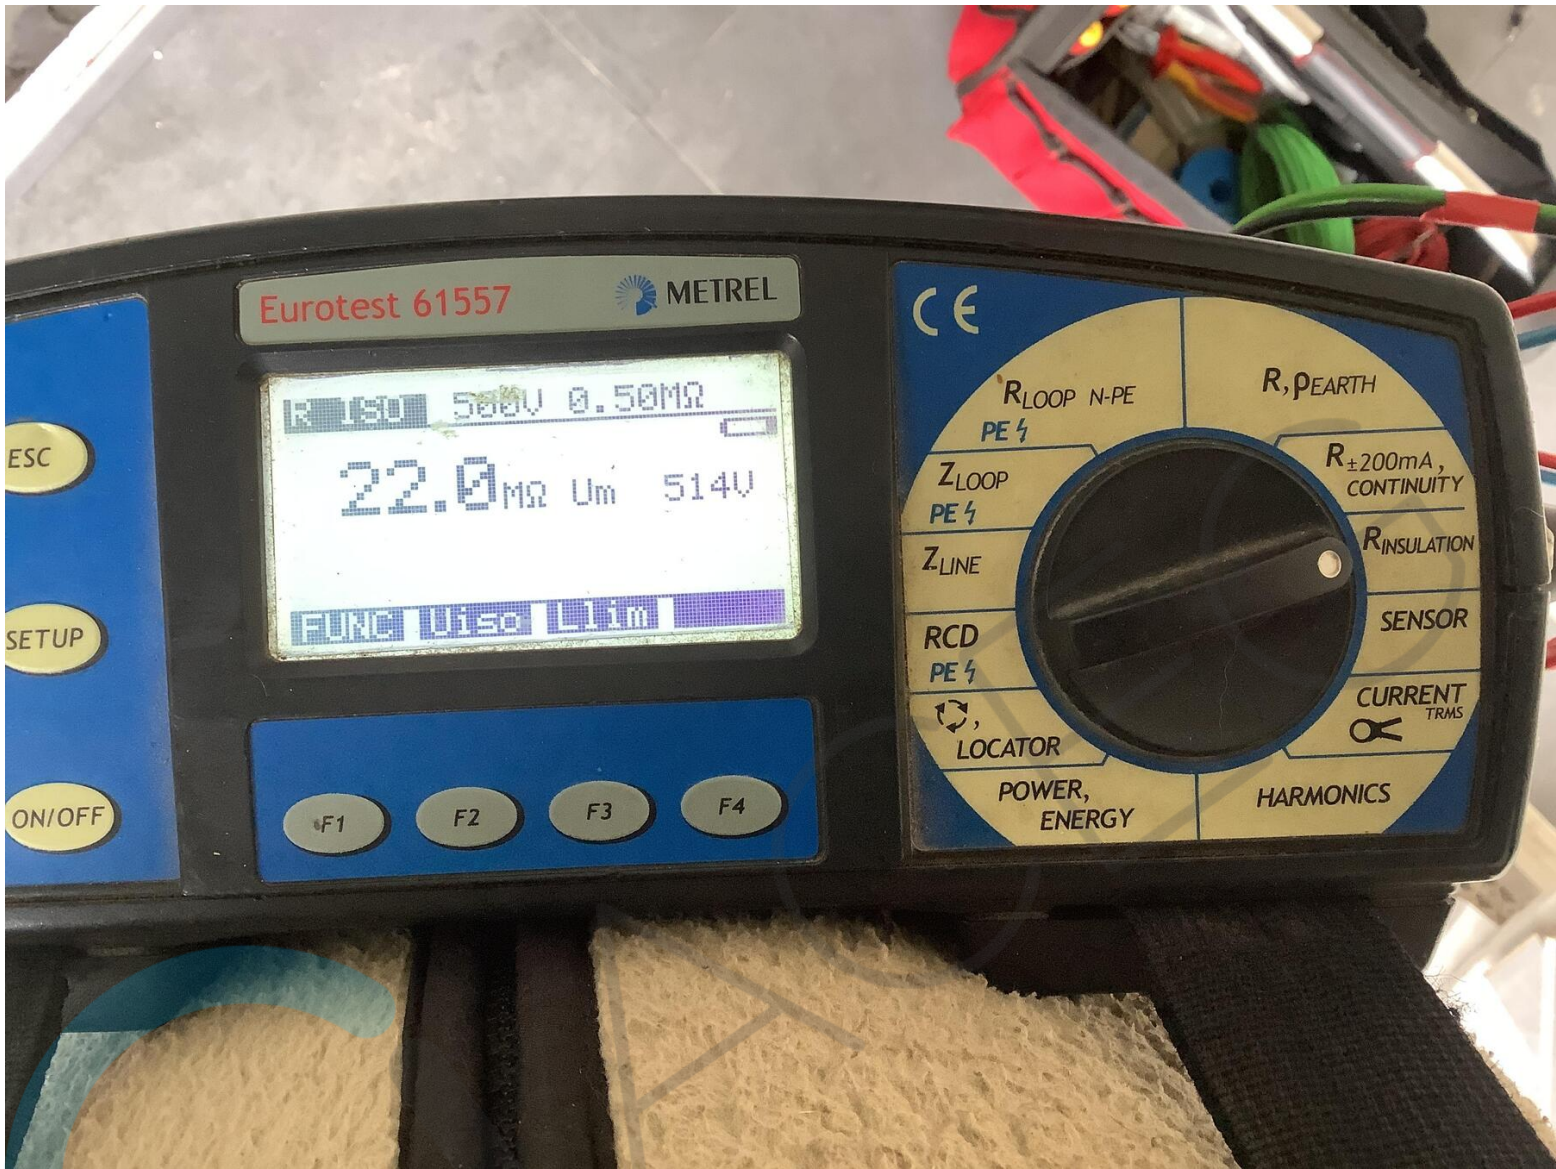

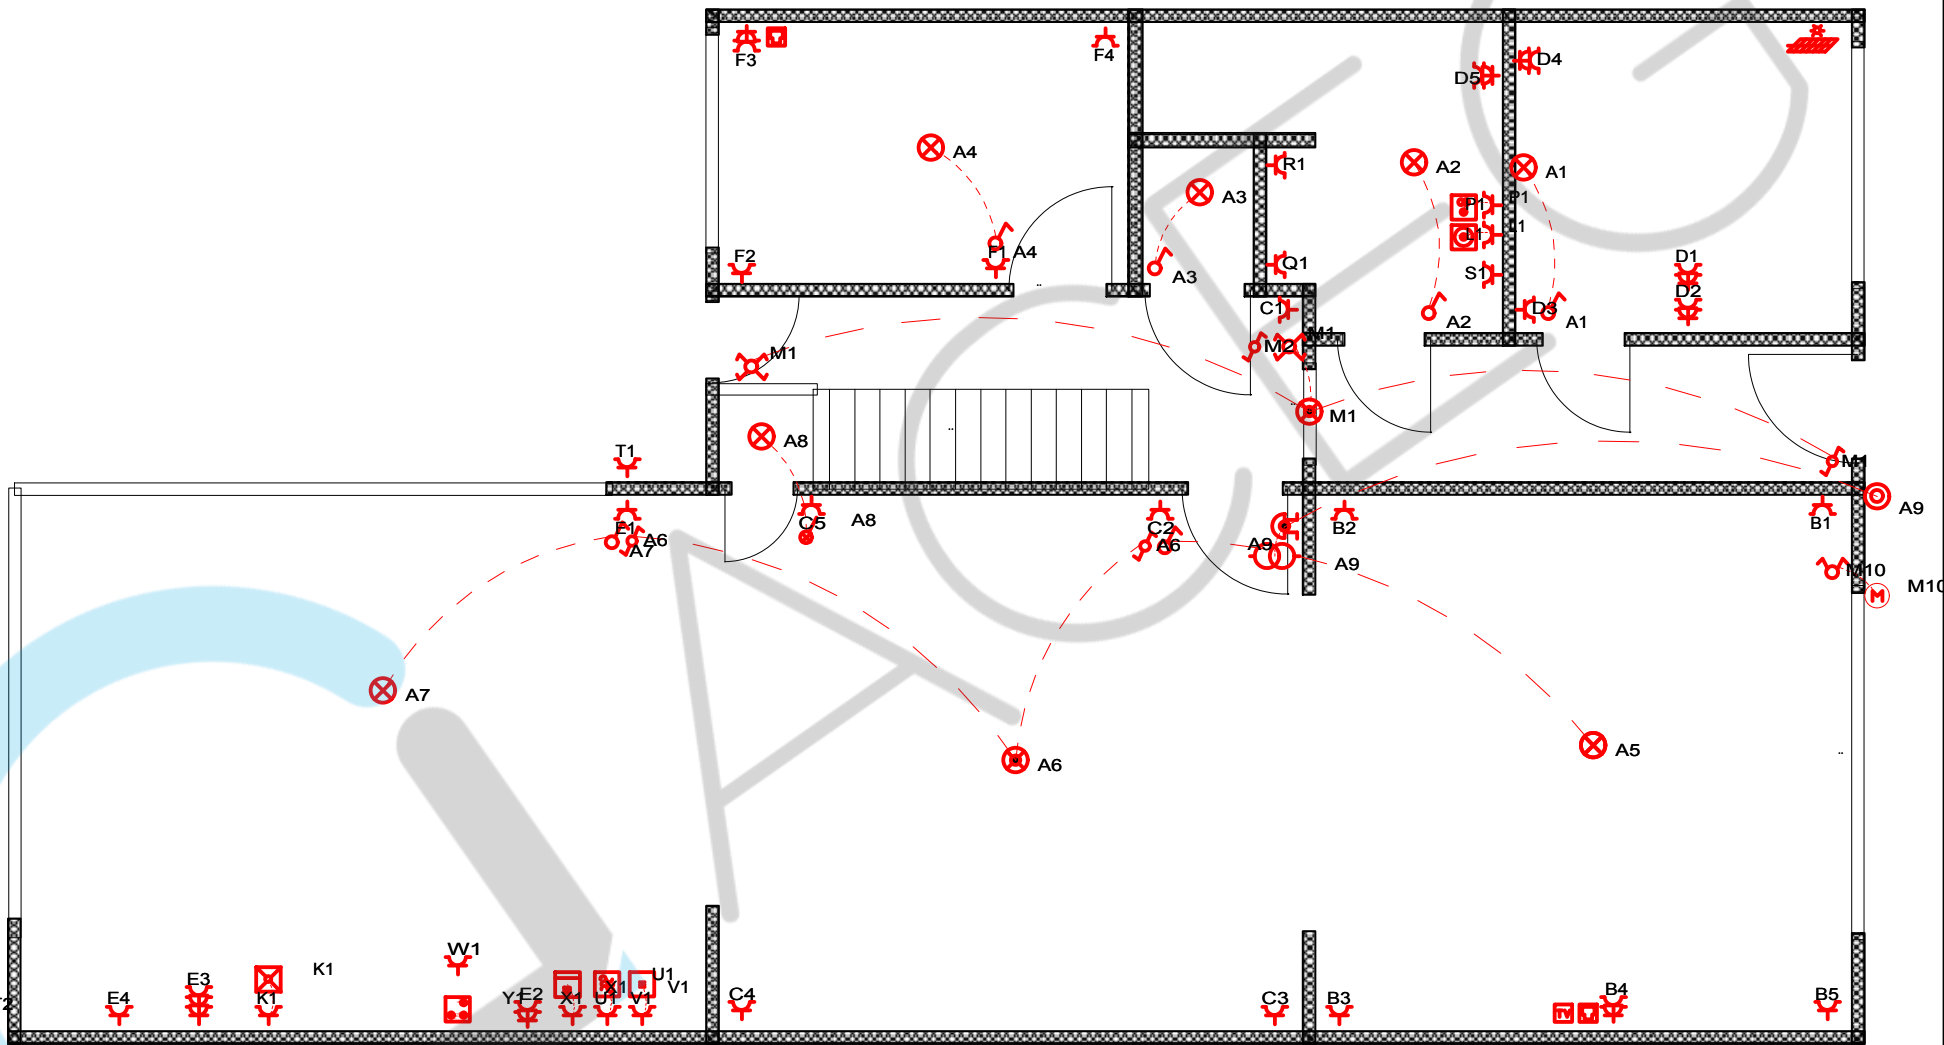

Baptiste Hollemaert

INSTALLATEUR

Naam Coppelec BV
BTW 0754.886.266
Datum 23/09/2024
Handtek

KEURING


ORGANIS. ACEG
Naam ..
Datum ..
Handtek ..

WERF

Naam De Decker
Straat Molenstraat 36
Gemeente 9988 Watervliet
Handtek ..

Gelijkvloers

3x230V/230V~

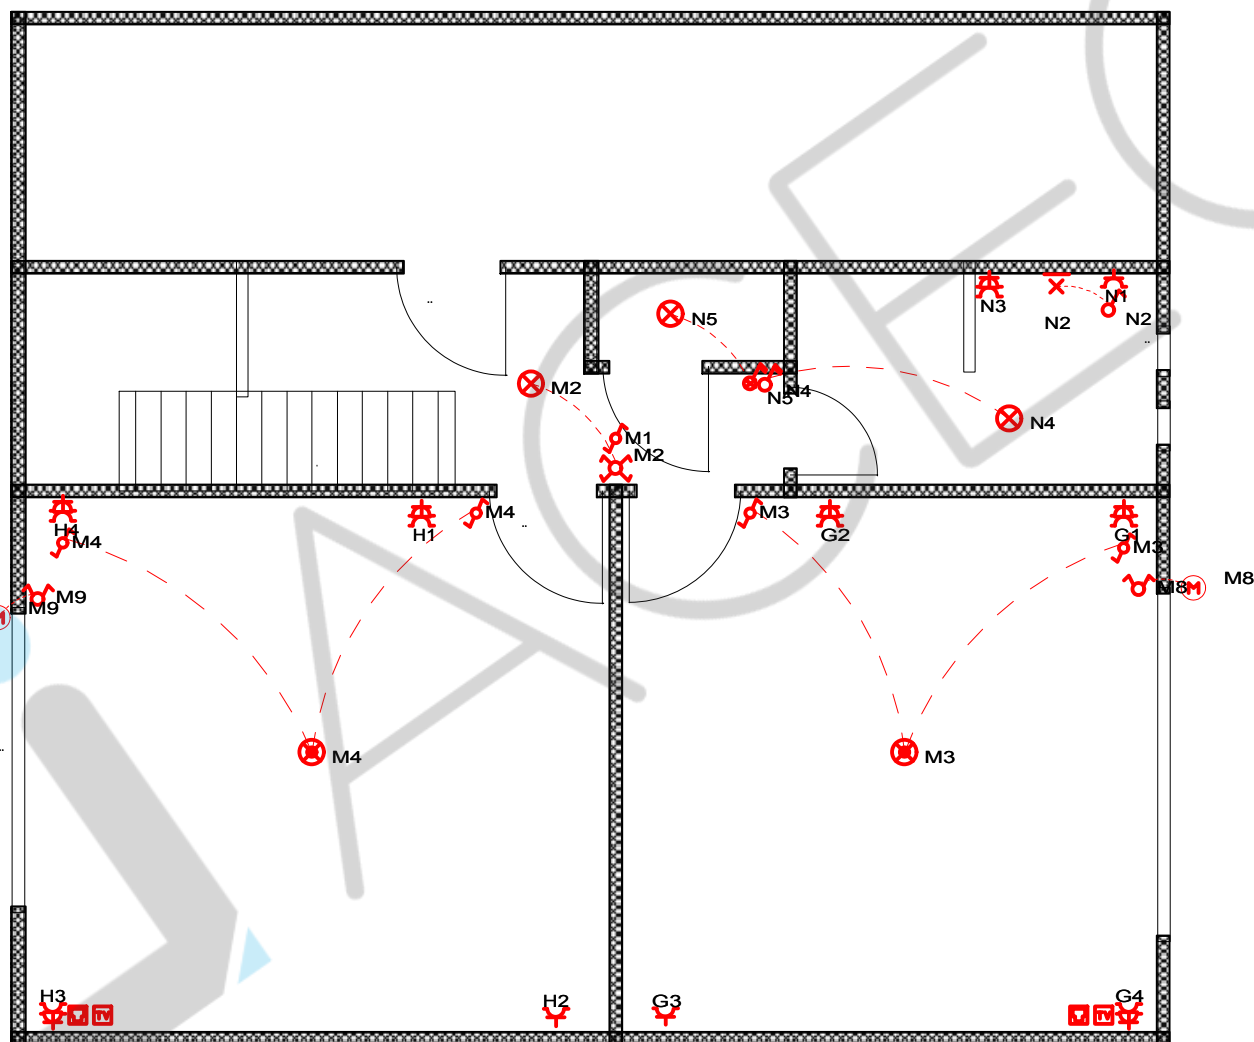

Baptiste Hollemaert

INSTALLATEUR

Naam Coppelec BV
BTW 0754.886.266
Datum 23/09/2024
Handtek

KEURING


ORGANIS. ACEG
Naam ..
Datum ..
Handtek ..

WERF

Naam De Decker
Straat Molenstraat 36
Gemeente 9988 Watervliet
Handtek ..

1ste Verdiep

3x230V/230V~

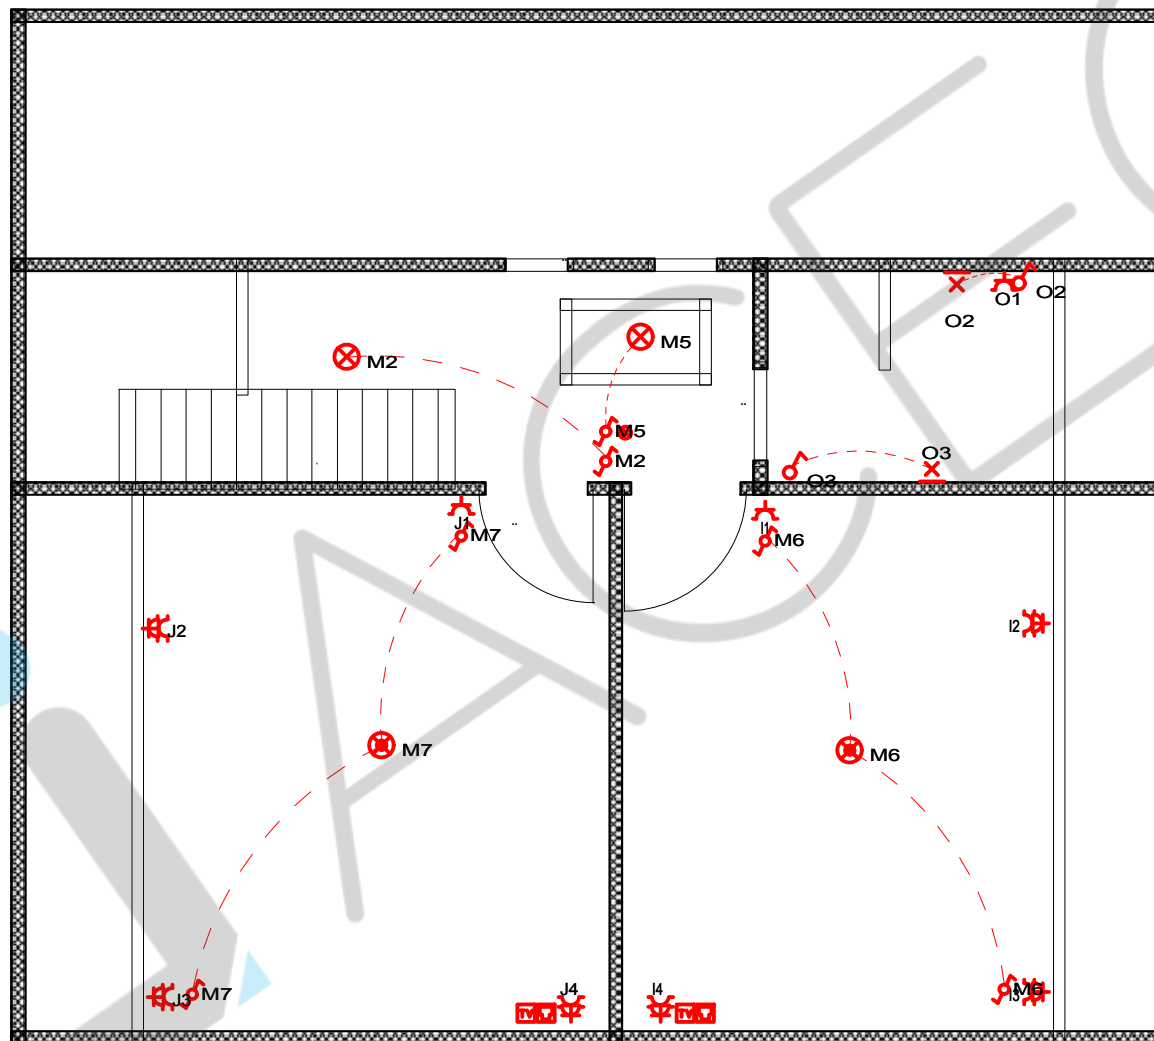

Baptiste Hollemaert

INSTALLATEUR

Naam Coppelec BV
BTW 0754.886.266
Datum 23/09/2024
Handtek

KEURING

ORGANIS. ACEG
Naam ..
Datum ..
Handtek ..


WERF

Naam De Decker
Straat Molenstraat 36
Gemeente 9988 Watervliet
Handtek ..

2de verdiep

3x230V/230V~

11/10/2024



	fix-o-cad software
--	--------------------
